

1. 今月号の注目現場！

第30回「東名高速床版取替」(PT日・9月27日)

第31回「金子新田排水路橋撤去工事」(PT日・10月19日)

工事名：東名高速床版取替 住所：神奈川県足柄上郡大井町山田 ほか

元 請：三井住友・日本ファブテック・極東興和JVさま

現場代理人：田中さん 当日の職長：五十嵐さん、稲川さん、吉岡さん

国土作業員：石井さん、植木さん、神田さん、齋藤直さん、坂上さん、下条さん、武仲さん、
富澤さん、西沢さん、波多さん、長谷川さん、原さん、真島勇さん、松平さん、
宮下さん、森岡さん、若杉さん 多数！！

工事内容：

本工事は東名高速道路の下り線左ルートを規制し、所領橋、滝川沢橋(小山)、酒匂川橋を主とした床版取替工事です。(追って鶴野橋も施工に入ります。)

これまでにない大規模、集中型の施工体制となるためリスクも高く、無事故無災害での完工が望まれます。

①所領橋(静岡県小山町)

施工：国土、第一カッター興業(株)さま

当日の作業内容：


P3付近WJはつり、コア削孔、壁高欄ワイヤソー切断

②滝川沢橋(小山)(静岡県小山町)

施工：第一カッター興業(株)さま、(株)鳶翔さま

当日の作業内容：

伸縮装置まわりハツリ、壁高欄ワイヤソー切断、床版カッター切断

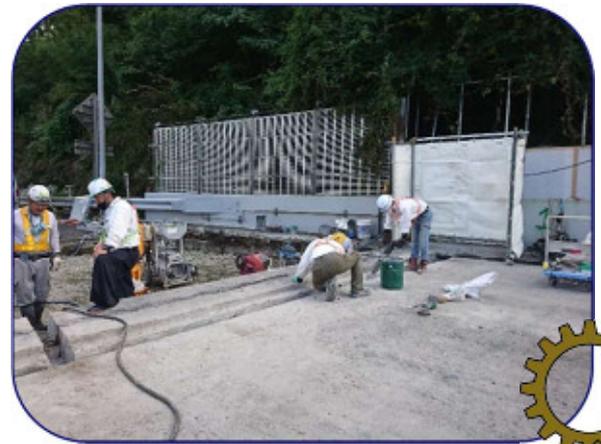

③酒匂川橋(神奈川県山北)

施工：第一カッター興業(株)さま、(株)オーテックさま

当日の作業内容：

壁高欄ワイヤソー切断、床版コア削孔、ジャッキ架台組立



見学台よりP1(静岡)方向を臨む

工事名：金子新田排水路橋撤去工事

(契約名：県営ため池等整備事業(用排水・特大)佐印川排水路地区 第1次工事)

住 所：三条市金子新田地内

金子新田工場団地内の現場で周辺には多くの工場がありました。

元 請：(株)吉田組さま 協力会社：第一カッター興業(株)さま

現場代理人：田村さん 国土作業員：猪爪さん、齋藤聖さん、清野さん(クレーンオペ)

橋 長：9.6m 幅員：4.7m 撤去工法：75tRCによるクレーン撤去

工事内容：大きな排水路の整備工事の一環として、排水路の端にかかる小さな排水路橋を撤去する工事です。

田村さん初の代理人現場です！約1週間で無事に終了しました。

当日の作業内容：床版カッター切断、地覆吊切り、伸縮吊切り

作業員：5名



現地到着時は、地覆吊切りをしていました。
なかなか切れない地覆だったようで、
作業員さんが苦勞されていました。

その後の吊上げ時は、猪爪さんが清野さんに合図をしており、安全な吊り作業を確認してきました。



↑ 施工前 ↑ ↓ 施工完了後 ↓



↑ 高欄撤去 ガス切断 ↑



↑ 主桁撤去 ↑


2. 今月号のパトロール報告

- 9/7 阿賀野跨線橋 阿賀野市 佐野さん
→契約先の昭和コンクリート工業(株)さまとの合同パトロールでした！台座コンクリート打設、高欄型枠組立等を行っていました。この現場は線路がすぐそばのため、飛散養生に関する指摘事項が多めでした。
- 9/10 建一第53号 旧新関地区集会所解体工事 新潟市秋葉区 岩崎さん
→9月からスタートした元請工事です。足場の組立や内装の解体を行っていました。
一部アスベストが使用された建物のため環境汚染・人体被害への対策を十分に行います。
- 9/22 緑ヶ丘跨道橋撤去工事 秋田県北秋田市 横山さん
→工事完了までもう少し。支保工の解体と搬出を行っていました。
- 9/27 東名高速床版取替 神奈川～静岡 田中さん
→今月号の注目現場！をチェック
- 10/5 阿賀野跨線橋 阿賀野市 佐野さん
→壁高欄コンクリート打設+養生と打設用足場解体を行っていました。
地上部、橋面上共に場内は整然と整理されており、不安全行動等の指摘事項はありませんでした。
- 10/14 建一第53号 旧新関地区集会所解体工事 新潟市秋葉区
→建物解体後の場内整地をBHにて行っていました。
BHやダンプの動線上空に架空線があるため、注意喚起や監視人の配置が必要です。
10月末で工事を完了し、11月の竣工検査に向けての準備が始まります。お疲れ様でした！
- 10/19 金子新田排水路橋撤去工事 三条市 田村さん
→今月号の注目現場！をチェック
- 10/25 東名高速床版取替 神奈川～静岡 田中さん
→所領橋（当日の作業・床版撤去、補強桁撤去、桁下地処理、PC床版架設）
複数作業時の声掛け合図良好で、不安全行動等の指摘事項はありませんでした。
→滝沢川橋（当日の作業・床版撤去、補強桁撤去、桁下地処理、PC床版架設）
資材仮置き場や詰所トイレ等の共有部分の整理整頓が良好です。保護具の使用状況も良好です。
ヤード内は狭く勾配がありますが、当社の大型クレーンも参加しての施工となります。
→酒匂川橋（当日の作業・壁高欄搬入・荷卸し、桁補強ボルト締付、アトラ孔明）
現場内の整理整頓は飛散対策も含め良好です。(他現場のお手本！)
また、不安全行動等の指摘事項はありませんでした。
残念ながら屋内共有部分の清掃がもう一息でした。お互いに協力しあって清掃を習慣づけましょう。



3. みんなの掲示板

今年度の国土菜園 終了！



2つ目に収穫したスイカは真っ赤で甘いものになりました。本社の皆さんとおしくいただきました。今年度最後の収穫となったカボチャは、小ぶりなものが5つできました。採れたてのカボチャの茎はみずみずしいことを初めて知りました！2週間ほど置いて茎が乾いた後、おうちで煮付けにさせていただきました。
